
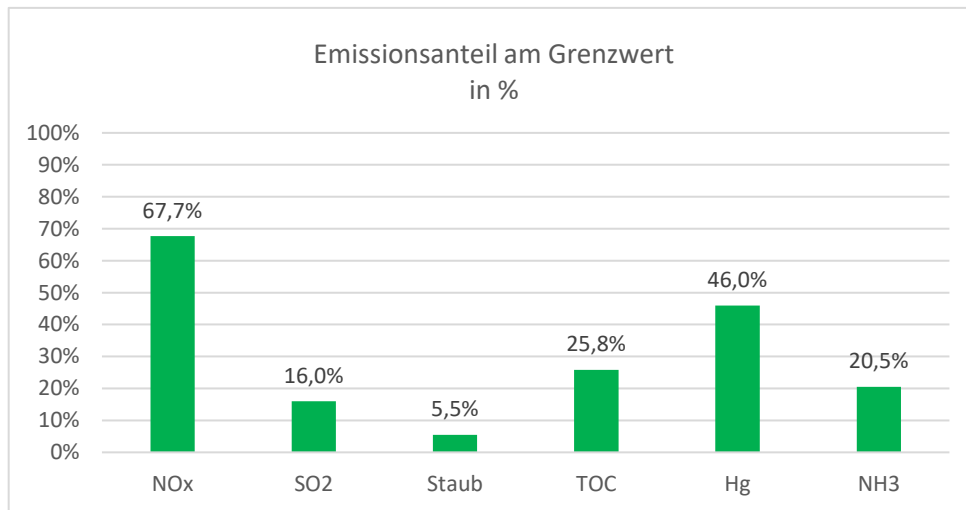


## Emissionswerte April 2021 Zementwerk Mannersdorf



Kontinuierliche Emissionsmessung April 2021 am Drehrohrofen 9							
	Einheit	Monats- mittelwert DO9	Grenzwerte MDF		Einhaltung der Grenzwerte		Gemeldete Überschreitungen Anzahl
			TMW	HMW	TMW in %	HMW in %	
NOx	mg/Nm <sup>3</sup>	338	200/500	200/500	100,0	99,0	1
SO2	mg/Nm <sup>3</sup>	56	350	350	100,0	100,0	0
Staub	mg/Nm <sup>3</sup>	1,1	20	20	100,0	100,0	0
TOC	mg/Nm <sup>3</sup>	31	120	120	100,0	100,0	0
Hg	mg/Nm <sup>3</sup>	0,023	0,05	---	100,0	---	0
NH3	mg/Nm <sup>3</sup>	8,2	30/40	---	100,0	---	0

  
Dr Christopher Ehrenberg  
Werksleiter

  
DI Martina Wagner  
Umweltschutzbeauftragte



